




JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA
WIZARA YA MAJI
MAMLAKA YA MAJISAFI NA USAFI WA
MAZINGIRA MJINI DODOMA
(DUWASA)

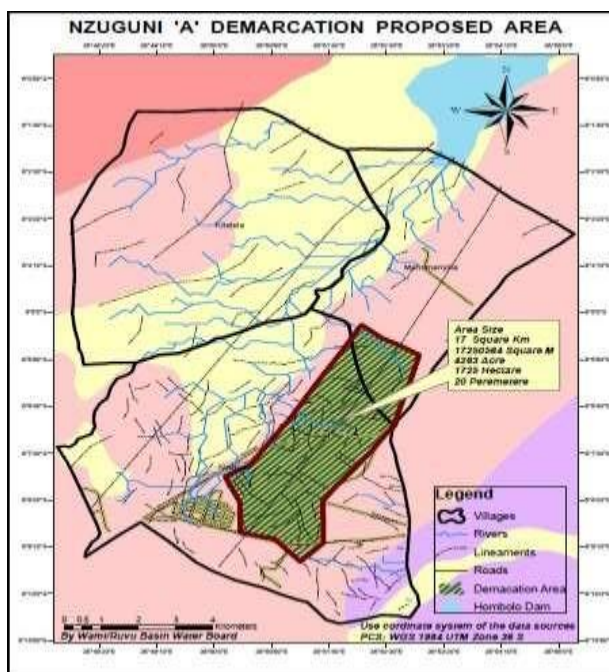

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MRADI WA MAJISAFI NZUGUNI

Imeandaliwa na: -
Ofisi ya Mkurugenzi Mtendaji,
DUWASA,
S.L.P 431,
Email: md@duwasa.go.tz
Website: www.duwasa.go.tz
Simu: +255 26 2324245
Fax: +255 26 2320060

DODOMA

April 2024

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MRADI YA MAJISAFI NZUGUNI PHASE I

1 Mradi wa Nzuguni Phase I

1.1 Lengo la Mradi

Kuboresha huduma ya usambazaji Maji katika Mji wa Dodoma kwa kuongeza uzalishaji wa maji kutoka lita **68,600,000** hadi **76,000,000** kwa siku, sawa na ongezeko la asilimia **11.7** kwa siku.

1.2 Hatua za Utekelezaji

Mpaka sasa mradi umefikia **asilimia 96%**. DUWASA inatekeleza ujenzi wa mradi huu kwa kutumia wazabuni saba (7) ambao ni; **TanESCO, Tanelec Limited Arusha, Master Drilling and Exploration Ltd, Help Desk Ltd, Davis & Shitriff Ltd, Judex Contractors na Tanzania Steel Pipes**. Kazi zinazofanyika ni pamoja na uchimbaji na uendelezaji wa visima vinne (04), ununuzi wa *transformer* sita, ujenzi wa mtandao wa kusafirisha na kusambaza maji wenye takribani **kilomita 7**, ujenzi wa matenki mawili yenye jumla ya ujazo wa lita **3,500,000**, ujezi wa vibanda vya kuendeshea pampu, ujenzi wa ofisi ya mradi, usimikaji wa pampu za kusukuma maji, ujenzi wa miundombinu ya umeme, ujenzi wa *fire hydrants*, upandaji wa miti, pamoja na ufungaji mfumo wa kompyuta wa **SCADA** utakaofanya mfumo huu uweze kujiendesha wenyewe. Mradi upo hatua ya mwisho wa umaliziaji wa kazi ndogondogo (*snags*) kama ujenzi wa fensi kwenye majengo na matenki, ujenzi wa mnara wa kuwekea mfumo wa kutibu maji (*chroline dosing tower*) pamoja na marekebisho madogomadogo.

1.3 Gharama za Mradi

Mradi huu una jumla ya mikataba **saba (7)** yenye thamani ya **Tsh. 4,391,901,658.77** Fedha zote za kutekeleza mradi huu zinatolewa na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia mapato yake ya ndani. Hadi sasa kiasi cha **Tsh. 3,101,221,461.56** kimelipwa kwa wakandarasi wote, sawa na **asilimia 71**.

1.4 Muda wa mradi

Mradi huu unatekelezwa kwa kipindi cha miezi sita kutoka tarehe ya kusaini mkataba na kupokea malipo ya awali. Mradi ulianza tarehe **7/2/2023** na ulitegemea kukamilika tarehe **7/8/2023**, lakini kutokana na changamoto ya kuchelewa kwa malipo ya awali pamoja na kazi za nyongeza, mradi unatarajiwa kukamilika tarehe **15/01/2024**

1.5 Faida/Mafanikio ya Mradi

Mradi huu unalenga kuhudumia watu wapatao **75,968** katika eneo la **Nzuguni, na baadhi ya maeneo jirani ya Kisasa, Ilazo na Swaswa**. Baada ya kukamilika kwa mradi huu uzalishaji wa maji utaongezeka kutoka wastani wa **50%** hadi **61.7%** ya mahitaji kwa siku.

1.6 Changamoto za Mradi

Kutokuendelea kwa kazi kutokana na malipo ya wakandarasi kuchelewa. Mpaka sasa wakandarasi wanadai hati za malipo zenye jumla ya **Tsh. 1,938,013,594.88** kama inalivyochanganuliwa hapa chini.

No.	Jina la Mkataba	Mzabuni/ Mkandara si	Gharama za Mkataba (Tsh.)	Kiasi Kilichopokelewa (Tsh.)	Kiasi kilicholipwa (Tsh.)	Kiasi Kilichobaki (Tsh.)
1	Supply and Installation of 500m3 and 3000m3 Galvanized Steel Water Tanks, to be used as Sump and Storage Tank at Nzuguni Water Project-Dodoma	Helpdesk Engineering Tanzania Limited	1,739,552,272.94	521,865,681.88	971,865,681.88	1,217,686,591.06
2	Supply of Steel Pipes and Fittings for Nzuguni Water Project-Dodoma	Tanzania Steel Pipes Limited	1,164,844,943.95	1,026,399,967.23	1,026,399,967.23	138,444,976.72
3	Supply and Installation of Submersible Pumps, Chlorine Dosing and SCADA System for Automatic Operation for Nzuguni Water Project - Dodoma	Davis & Shirtliff (T) Limited	696,777,481.28	487,744,236.89	487,744,236.89	209,033,244.39
4	Construction of Water Supply project at Nzuguni Area.	Judex Contractors Limited	477,986,000	105,137,217.29	297,206,560.00	372,848,782.71
5	Supply of Transformers	Tanelec Limited Arusha	93,225,560.00	93,225,560.00	93,225,560.00	-
6	Drilling of 5 Boreholes at Nzuguni	Master Drilling	219,515,400.60	219,515,400.60	219,515,400.60	-
7	Connection of Electricity to Nzuguni	TanESCO	5,264,054.96	5,264,054.96	5,264,054.96	-
	Jumla		4,397,165,713.73	2,459,152,118.85	3,101,221,461.56	1,938,013,594.88

2 HITIMISHO

DUWASA inaishukuru Serikali ya awamu ya **Sita (6)** kupitia Wizara ya Maji kwa kuendelea kuipa kipaumbele Dodoma hususani DUWASA katika kutatua changamoto za upatikanaji wa maji Mjini Dodoma.
